

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом утвержденной инвестиционной программы за 2 квартала 2025 года

Наименование субъекта естественной монополии: АО "Астана-Теплотранзит"

Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии

тыс. тенге (без НДС)

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестпрограммы (проекта)			Причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы			
			план	факт	план	факт	отклонение		Собственные средства (амортизация)	Заемные средства	Бюджетные средства	Нерегулируемая (иная) деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Инвестиционная программа на 2025 год												
Раздел I. Реконструкция объектов												
Тепловые сети:												
1.1	Реконструкция тепловых сетей УТ-4(1) от ул.Т. Шонаулы, 4П до теплового узла в районе ул. Т. Шонаулы, 28.	м.трассы	6 902	0	2 421 040	0	-2 421 040	Проведены экспертизы проектов. Ведутся строительно-монтажные работы. Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года	0	0	0	0
1.2	Реконструкция теплотрассы квартал 107 от УТ-16(2) до ул. Есенберлина, 11-13, ул. Биржан Сал, 2	м.трассы	466	0	74 412	0	-74 412		0	0	0	0
1.3	Реконструкция тепловых сетей от врезки в теплотрассу 2Ду300мм (в ППУ-ПЭ) в районе УТ-14(3) ул. Молдагуловой до теплотрассы 2Ду300мм в ППУ-ПЭ-изоляции в районе ул. Потанина, 14	м.трассы	678	0	165 958	0	-165 958		0	0	0	0
1.4	Реконструкция тепловых сетей район 16, пр. Республики, 52/1 (ТД Сулпак)	м.трассы	467	0	169 897	0	-169 897		0	0	0	0
1.5	Реконструкция тепловых сетей от УТ-5(30) до Коргалжинское шоссе, 2/1 (Столичный цирк), пр. Кабанбай батыра, 5 (жк Радуга)	м.трассы	268	0	83 991	0	-83 991		0	0	0	0
1.6	Реконструкция теплотрассы ул.Ташенова, 9,15 (м-н Молодежный, 1-ый участок, вынос из подвала ул.Ташенова, 13 транзитной трассы; УТ-29(23)	м.трассы	555	0	84 773	0	-84 773		0	0	0	0
1.7	Реконструкция теплотрассы ул.Ташенова, 9,15 (м-н Молодежный, 1-ый участок, вынос из подвала ул.Ташенова, 13 транзитной трассы; УТ-29(23)	м.трассы	565	0	111 416	0	-111 416		0	0	0	0
1.8	Реконструкция теплотрассы от ул.Дукенулы 22 до УТ 10(6)	м.трассы	587	0	94 713	0	-94 713		0	0	0	0
1.9	Реконструкция тепловых сетей от УТ-10(20) до ул.Сембинова, 28/3	м.трассы	862	0	176 716	0	-176 716		0	0	0	0
1.10	Реконструкция тепловых сетей на ППУ 2Ду200/150/133/100мм вдоль ул. Луи Пастера до жк "Хан Тенгри"	м.трассы	793	0	177 967	0	-177 967		0	0	0	0
1.11	Реконструкция теплотрассы пос. Энергетиков в границах улиц Саргуль - Алиева УТ-4 (24) (1-й участок: от НС-4 до секции перед ул. Высоцкого)	м.трассы	740	0	137 683	0	-137 683		0	0	0	0
1.12	Реконструкция ТМ-51, Ду 1000	м.трассы	185	0	232 615	0	-232 615		0	0	0	0
1.13	Реконструкция трансформаторной в АБК-2	услуга	1	0	162 371	0	-162 371		0	0	0	0
1.14	Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-75 до ТП-1670 (L=1950.п.)	услуга	1	0	87 726	0	-87 726		0	0	0	0
1.15	Реконструкция кровли здания АБК по пр.Туран 12	услуга	1	0	96 441	0	-96 441		0	0	0	0
1.16	Капитальный ремонт (замена) тепломатриалы ТМ-43 по ул. Сейфуллина от ул. Кумисбекова до ул. Бейсековой 2Ду500мм. 1-очередь	м.трассы	136	0	163 837	0	-163 837		0	0	0	0
1.17	Капитальный ремонт (замена) тепломатриалы ТМ-43 по ул. Сейфуллина от ул. Кумисбекова до ул. Бейсековой 2Ду500мм. 2-очередь	м.трассы	164	0	158 345	0	-158 345		0	0	0	0
1.18	Капитальный ремонт (замена) тепломатриалы ТМ-43 по ул. Сейфуллина от ул. Кумисбекова до ул. Бейсековой 2Ду500мм. 3-очередь	м.трассы	438	0	588 716	0	-588 716		0	0	0	0
Проектирование и экспертиза объектов реконструкции на предстоящие периоды			15		132 036	3 573	-128 463		3 573	0	0	0
1.19	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция тепломатриалы ТМ-10 (участок УТ-10/УТ-13 от ул. Ауэзова до ул. Мамбетова (участок УТ16/УТ17) от ул.Бухарбай батыра 21 до ул. Кенесары 24"	работа	1	0	3 558	188	-3 370		188	0	0	0
1.20	Проектирование и экспертиза проекта "Капитальный ремонт участков ТМ-33 2Ду800мм ППУ-ПЭ переход пр.Аблай хана"	работа	1	0	4 805	157	-4 648		157	0	0	0
1.21	Проектирование и экспертиза проекта "Капитальный ремонт участка теплотрассы 2Ду800 ППУ-ПЭ (ТМ-33) под автомобильной дорогой, переход ул.Мустафина"	работа	1	0	5 008	71	-4 937		71	0	0	0
1.22	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция (переукладка на мостовой переход ТМ-23) участков ТМ-33(Ду800мм), ТМ-18(Ду1000мм), сеть Ду150мм на АО "Астана-Теплотранзит"	работа	1	0	14 753	389	-14 364		389	0	0	0
1.23	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция теплотрассы ТМ-33(Ду800мм), ТМ-18(Ду1000мм) переход пр.Аль-Фараби (в районе П-1(18))"	работа	1	0	5 244	200	-5 044		200	0	0	0
1.24	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция теплотрассы от врезки 2Ду219мм в ППУ-ПЭ до врезки на 2Ду 159мм на ул.Сейфуллина 34"	работа	1	0	4 046	68	-3 978		68	0	0	0

1.24	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция теплотрассы от врезки в теплотрассу 2Ду 325мм в ППУ ПЭ (район компенсатора) через подвал ул.Ауезова 16 (УТ-10 (9), до врезки в теплотрассу 2Ду325мм в ППУ ПЭ (район УТ-11(9))"	работа	1	0	5 626	162	-5 464	Проведено техническое обследование тепловых сетей. Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года	162	0	0	0		
1.25	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция тепловых сетей по пр.Б.Момышұлы 13/1, 13/2, 13/3, 13а, 15а"	работа	1	0	9 003	251	-8 752		251	0	0	0		
1.26	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция участка ТМ-51 от железной дороги до опуска ул.Мустафина"	работа	1	0	5 454	182	-5 272		182	0	0	0		
1.27	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция тепловой сети 2Ду300мм в районе ул.Кажымукана,1"	работа	1	0	6 171	90	-6 081		90	0	0	0		
1.28	Реконструкция теплотрассы Ду150/100/80/50мм ул.Куйши Дина 2/1, пр.Тауелсиздик 24,24а,24б	работа	1	0	6 500	205	-6 295		205	0	0	0		
1.29	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция теплотрассы Абылай хана 42"	работа	1	0	15 705	374	-15 331		374	0	0	0		
1.30	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция теплотрассы от УТ-2(27) до ответвления на МЖК «Гарант» 2Ду80-300 мм"	работа	1	0	8 983	215	-8 767		215	0	0	0		
1.31	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция теплотрассы УТ-44(2) от стыковки с ППУ-ПЭ в районе ул. Байсеитовой, 4 до пер.Куракты, 16(ул.Суворова), пер. Баркытбет, 28, 2Ду 70-250мм"	работа	1	0	28 598	807	-27 791		807	0	0	0		
1.32	Проектирование и экспертиза проекта "Реконструкция теплотрассы от УТ-14(7) до пр.Жеңіс, 36 1 2Ду100-200мм"	работа	1	0	8 584	214	-8 370	214	0	0	0			
Итого по разделу 1:									3 573	0	0	0		
Раздел 2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования														
2.1	Погружной насос для сточных вод 30/50 (подача 51 м3/ч, напор - 16 м, мощность – 2,2 кВт, температура рабочей среды – от 0 до +40 °С, диаметр выход. отверстий, 2½ дюйма, глубина погружения до 10 м.)	единица	1	1	387	161	-226	Исполнено. Экономия по итогам закупок	161	0	0	0		
2.2	Насос для загрязненных вод Гном (Подача 25 м3/ч, напор 20 м, температура рабочей среды – до+35°С, мощность электродвигателя 3,0 кВт, глубина погружения 7 м.)	единица	1	1	141	81	-60		81	0	0	0		
2.3	Ручной экструдер для изготовления фасонных изделий (Работа с сырьем - полиэтиленовый сварочный пруток Ø3-4мм, пневматический механизм подачи прутка)	единица	2	2	5 348	6 578	1 230		6 578	0	0	0		
2.4	Сварочный полуавтомат (Состав комплекта - инверторный источник питания, механизм подачи проволоки, блок охлаждения, питание от сети 380В, механизм подачи проволоки 4-х роликовый, номинальная мощность 18 кВА-20 кВА, скорость подачи проволоки от 0-25 м/мин)	единица	2	2	11 994	11 994	0		11 994	0	0	0		
2.5	Электродвигатель (номинальная мощность, кВт 580; Номинальное напряжение питающей сети, 6000 В; Номинальная частота питающей сети, Гц 50; Номинальная скорость вращения, об/мин1490; Коэффициент мощности 0,88; Номинальный ток, 67,3 А; КПД: 95,4% Класс нагревостойкости изоляции F; Степень защиты IP54)	единица	1	0	77 306	0	-77 306	Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года	0	0	0	0		
2.6	Электродвигатель (Мощность: 315 kW; Частота сети: 50 Hz; Число полюсов: 4; Частота вращения: 1490 rpm; Скольжение: 0,67 %; Номинальное напряжение: 380/660 V; Номинальный ток не более: 600/345 A; Пусковой ток не менее: 4740/2730 A)	единица	1	0	12 252	0	-12 252		0	0	0	0		
Итого по разделу 2:					единица	8	6	107 428	18 814	-88 614	18 814	0	0	0
Раздел 3. Приобретение лицензионных программ и оргтехники														
3.1	Автоматизированная система управления производством (разработка, реализация и внедрение подсистемы «Учет технического состояния тепловых сетей и уровня их эксплуатации по показателям «тепловые потери» и «потери сетевой воды» в программном обеспечении Автоматизированной системы управления производством АО «Астана-Теплотранзит» на базе ТГИД-07sql)	услуга	1	0	14 000	0	-14 000	Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года	0	0	0	0		
Итого по разделу 3:					услуга	1	0	14 000	0	-14 000	0	0	0	0
Раздел 4. Приобретение приборов и систем														
4.1	Течеискатель (цветной сенсорный дисплей 5,7" VGA 640x480 пикселей, Подключение: датчик, гидрофон, две внешние антенны, наушники, GPS, наземный микрофон, пьезо-датчик с активным усилителем)	единица	1	0	5 867	0	-5 867	Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года	0	0	0	0		
4.2	Тепловизор (диапазон рабочих температур –15 до +50 °С, диапазон измерений -20 до +250°С, мин. дистанция фокусировки 0,5м, разрешение экрана не менее 160 x 120 пикселей (ИК), не менее 320 x240 пикселей (MSX)	единица	1	0	1 253	0	-1 253		0	0	0	0		
4.3	Лазерный дальномер (Диапазон измерения 0,05-100 м, погрешность 10мм, пыли-, влагозащищенность)	единица	11	0	266	0	-266		0	0	0	0		
Итого по разделу 4:					единица	13	0		7 386	0	-7 386	0	0	0

Раздел 5. Приобретение транспорта и спецмеханизмов												
5.1	Автокран г/п 16 тонн (грузоподъемность -не менее 16т, высота подъема, м - не менее 8,7-18,4, Опоры установки – гидравлические, шарнирно-выносные. Привод механизмов крана – гидравлический от насоса, приводимого в действие двигателем шасси.)	единица	2	0	98 244	0	-98 244	Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года	0	0	0	0
5.2	Автовышка 18-м (грузоподъемность установки не менее 300 кг. Вылет стрелы не менее 22 м.)	единица	1	0	21 777	0	-21 777		0	0	0	0
5.3	Трактор колесный с бульдозерным отвалом и свар. генератором (тип трактора-колесный, универсальный класса 1,4 тс, Навесной бульдозерный отвал ОЖ-82 спереди трактора, тип неповоротная сферическая фронтальная лопата -жесткий неповоротный, подъем/опускание одним гидроцилиндром, установка на полураме, закрепленный за лонжероны, сварочный генератор сзади трактора на навесной раме, тип ГД 2*2503, двухпостовой сварочный генератор)	единица	4	0	59 268	0	-59 268		0	0	0	0
5.4	Седелный тягач (Снаряженная масса – не менее 7 200 кг, нагрузка на переднюю ось – не менее 4 000 кг., нагрузка на заднюю тележку – не менее 3 200 кг., нагрузка на сетельное сцепное устройство – не менее 15 000 кг.)	единица	1	0	42 507	0	-42 507		0	0	0	0
5.5	Полуприцеп Нефаз 20 тонн (Кузов Тип – металлический, бортовой, прямоугольной формы с откидными боковыми, задними бортами Тележка – двухосная Опорное устройство Тип – два винтовых домкрата Масса перевозимого груза не менее 19 400 кг Объем кузова не менее – не менее 21,7 куб.м. Снаряженная масса – не менее 6 400 кг Полная масса – не менее 25 800 кг)	единица	1	0	8 455	0	-8 455		0	0	0	0
5.6	Экскаватор колесный 0,85 м3 в комплекте с быстросъемным механизмом	единица	1	0	86 429	0	-86 429		0	0	0	0
5.7	Экскаватор-погрузчик в комплекте с быстросъемным механизмом, дополнительным ковшом 400мм	единица	1	1	53 802	53 800	-2	Исполнено. Экономия по итогам закупок	53 800	0	0	0
5.8	Илососная машина на шасси КАМАЗ-65115	единица	1	0	90 590	0	-90 590	Достижение плановых показателей осуществится до конца текущего года	0	0	0	0
Итого по разделу 5:		единица	12	1	461 071	53 800	-407 271		53 800	0	0	0
ВСЕГО на 2025 год:					3 489 500	76 187	-3 413 312		76 187	0	0	0

Председатель Правления

К.Бегимов

Аварам

К.Бегимов



Фотоматериалы
к информации о ходе исполнения
утвержденной инвестиционной
программы за 2 квартала 2025 года



Раздел 1. Реконструкция тепловых сетей

Работы по реконструкции объектов теплоснабжения




п.1. от ул.Т.Шонанулы
41/1 до теплового узла
ул.Т.Шонаулы,28



п.2. от УТ-16(2)
до ул. Есенберлина, 11-13



п.3. УТ-14(3)
ул.Молдагуловой

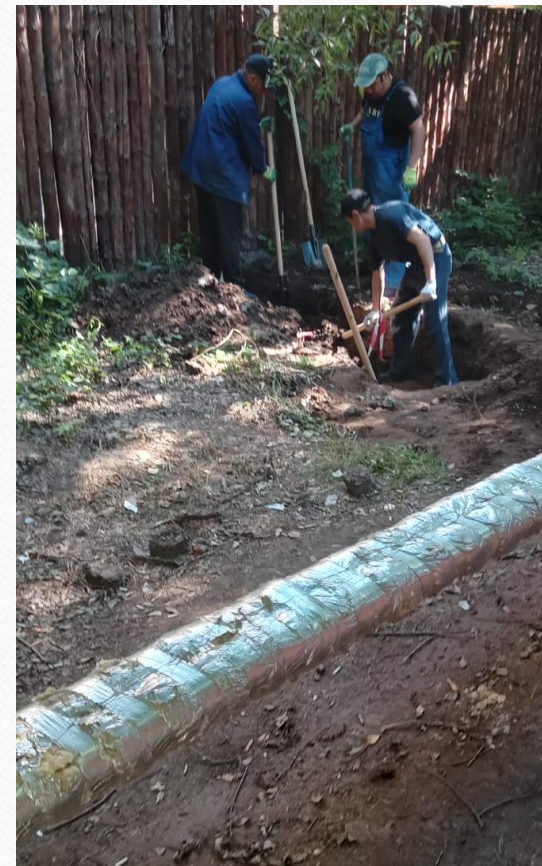

п.4. пр. Республики,
52/1 (ТД Сулпак)


Работы по реконструкции объектов теплоснабжения



п.6. ул.Ташенова, 9,15



п.8. ул.от УТ-10(20)
до ул.Сембинова 28/3

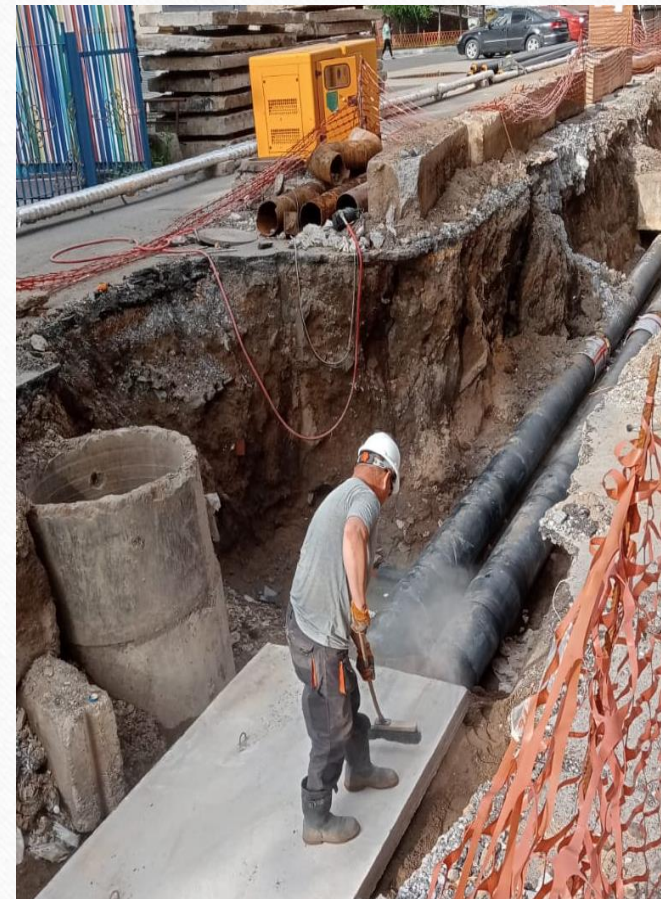

п.9. ул. Луи Пастера
до жк "Хан Тенгри"₄



Раздел 2. Замена устаревшего и приобретение нового оборудования


2.1 Погружной насос
для сточных вод




2.2 Насос для
загрязненных вод



2.3 Ручной экструдер

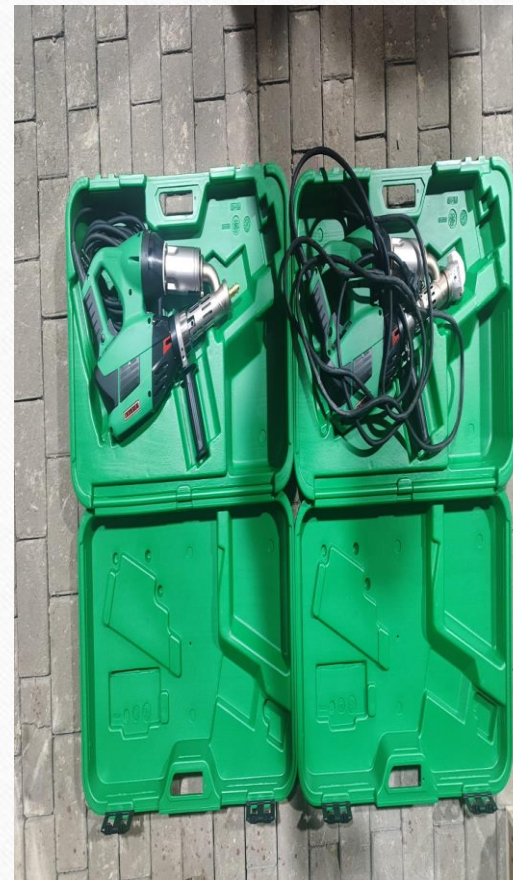

2.4 Сварочный
полуавтомат

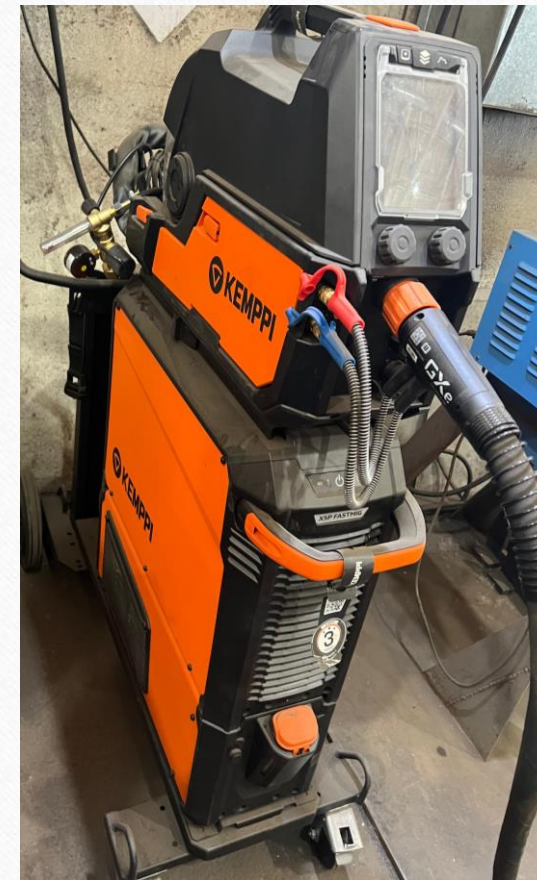



Раздел 5. Приобретение транспорта и спецмеханизмов

5.7 Экскаватор-погрузчик

