

Табиғи монополиялар субъектісінің атауы: "Астана - Теплотранзит" АҚ

Қызмет түрі: жылу энергиясын беру және тарату

Инвестициялық бағдарлама ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің 2022 жылғы 28 ақпандағы № 16-НҚ және қаланың Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы №06-12/29 бірлескен бұйрығымен бекітілген.

Р/с №	Қаржыландыру көзінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																
	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның сомасы), мың теңге ҚҚС-сыз		Меншікті қаражат			ауытқудың себептері	Қарыз қаражаты		Бюджеттік қаражат		Реттелмеген (өзге) қызмет		
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу		жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>2022 жылға БАРЛЫҒЫ</b>				1 704 351	66 862	1 704 351	66 862	-1 637 489								
	<b>1-бөлім. Объектілерді қайта жаңарту, жобалау</b>																
	<b>Орамшілік желілер:</b>	<b>трассаның к.м.</b>	<b>6 674</b>	<b>0</b>	<b>1 474 296</b>	<b>35 861</b>	<b>1 474 296</b>	<b>35 861</b>	<b>-1 438 435</b>								
1.1	Бейбітшілік даңғылы, 40,42,44 бойынша 2Ду100мм-150мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	143	0	10 160	0	10 160	0	-10 160	Жоба бойынша сараптамалар жүргізілді. Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде. Жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізу ағымдағы жылдың соңына дейін жүзеге асырылады							
1.2	Желтоқсан көшесі, 15 бойынша 25(8)КТ-дан бастап Омаров көшесі бойынша ПД-ге дейін 2Ду 325 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	264	0	108 301	0	108 301	0	-108 301								
1.3	Республика даңғылы, 3/2 жағына қарай Республика даңғылы, 7/1 бойынша 2ДУ 426 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	324,5	0	157 118	0	157 118	0	-157 118								
1.4	Сарыарқа көшесі, 20 (мектеп) бойынша 2 Ду 65мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	95	0	12 635	0	12 635	0	-12 635								
1.5	Бейбітшілік көшесі, 58,56,54 бойынша 2Ду 65мм-125мм жылу трассасын қайта жаңарту (жертөледен ж/ж шығару)	трассаның к.м.	241	0	40 675	0	40 675	0	-40 675								
1.6	Пригородный кенті бойынша Арнасай көшесі бойынша 2Ду 57 мм-150 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	247	0	31 521	0	31 521	0	-31 521								
1.7	Потанин көшесі бойынша (№8 үйден бастап № 4 үйге дейін) 2Ду70 мм-150 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	286	0	22 400	0	22 400	0	-22 400								
1.8	8(9) КТ-дан бастап Республика даңғылы, 25 дейінгі 144-орамның 2Ду89 мм-219 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	216	0	86 438	0	86 438	0	-86 438								
1.9	Құдайбердіұлы көшесі, 4 бастап Абылай хан даңғылы, 3 дейін жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	1 608	0	453 261	35 861	453 261	35 861	-417 400								
1.10	Жұмабаев көшесі, 5,7 бойынша қолданыстағы жылу желілерін қайта жаңарту (жертөледен шығару)	трассаның к.м.	568	0	65 448	0	65 448	0	-65 448								
1.11	Кенесары көшесі, 82 бойынша (15(19-КТ)) жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	287	0	67 998	0	67 998	0	-67 998								
1.12	Әл-Фараби шағын ауданындағы Мақтымқұлы көшесі, 15 бастап Күйші Дина көшесі, 44/1 дейінгі учаске 7(23)-КТ жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның к.м.	911	0	242 448	0	242 448	0	-242 448								
1.13	Рысқұлбеков көшесі, 8,8а бойынша Т1,Т2, Ду 80-150мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	185	0	17 163	0	17 163	0	-17 163								
1.14	Кенесары көшесі, 79/1 бастап Егемен Қазақстан көшесі, 6/2 дейін 8(20)КТ Ду 100-50мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	145	0	20 378	0	20 378	0	-20 378								
1.15	Шевченко көшесі, 8 бойынша "Сана" ТК, Т1,Т2, Ду 80-200мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	347	0	42 477	0	42 477	0	-42 477								
1.16	129-орамдағы Мәмбетов көшесі, 8/2 бойынша Ду 200мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	177	0	22 178	0	22 178	0	-22 178								
1.17	144-орамдағы Республика даңғылы, 30 (Шамбала) Ду50-80мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	80	0	6 596	0	6 596	0	-6 596								
1.18	10(32)КТ-дан бастап Сауран көшесі, 4 Мемлекеттік қызметкерлердің т.к., Сауран көшесі, 3 бойынша "Құлагер" т.к., Достық көшесі, 12/1 бойынша "БГМ" т.к., Сығанақ көшесі, 21/1 бойынша "Меруерт" т.к. дейін Ду 100-150 мм жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның к.м.	549	0	67 101	0	67 101	0	-67 101								
1.19	"ПТУ құю барысын жергілікті желдету" қайта жаңарту	жұмыс	1	0	7 779	0	7 779	0	-7 779								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2023 жылғы қайта жаңарту объектілерін жобалау және сараптау	жұмыс	13	0	100 244	0	100 244	0	-100 244								
1.20	Жеңіс даңғылы, 62, Бейбітшілік көшесі, 73, Алтынсарин көшесі, 2 (ҚазАТУ аумағы) бойынша 2Ду 57мм-325мм жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	15 603	0	15 603	0	-15 603	Жоспарлы көрсеткіштерге ағымдағы жылдың соңына дейін қол жеткізіледі							
1.21	134-орамдағы Бейбітшілік көшесі, 24.26.28, Бөгенбай батыр көшесі, 50/1, Әуезов көшесі, 27,25 бойындағы үйлердің 2Ду57мм-219мм жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	4 338	0	4 338	0	-4 338								
1.22	4-шағын ауданы, Қажымұқан көшесі, 14 бастап Петров көшесі, 21/2 дейін жобаны жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	15 691	0	15 691	0	-15 691								
1.23	Ташенов көшесі, 3 ЖК бастап Ташенов көшесі, 16 дейін жылу желілерінің (29(23-ҚТ) жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	6 743	0	6 743	0	-6 743								
1.24	13(11)ҚТ-дан бастап Кеменгерұлы көшесі, 21 дейін жылу желілерінің жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	14 887	0	14 887	0	-14 887								
1.25	Петров көшесі, 18/1 бойынша 8(42)-ҚТ жылу трассасының жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	9 262	0	9 262	0	-9 262								
1.26	4(24) ҚТ-дан бастап Еренқабырға көшесі, 14/6 дейін жылу трассасының жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	9 677	0	9 677	0	-9 677								
1.27	Энергетиктер кентінің Сарғұл - Әлиев көшелері шекарасындағы 4 (24)ҚТ жылу трассасын жобалау және сараптау (2-учаске: Высоцкий көшесі алдындағы секциядан бастап Жерек көшесі бойынша секцияға дейін)	жұмыс	1	0	6 468	0	6 468	0	-6 468								
1.28	Күйші Дина көшесі, 25/1 бойынша жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	2 707	0	2 707	0	-2 707								
1.29	Уәлиханов көшесі, 9/1, 9/2 бойынша жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	3 349	0	3 349	0	-3 349								
1.30	10(6)ҚТ-дан бастап Дүкенұлы көшесі, 22 дейін жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	5 160	0	5 160	0	-5 160								
1.31	14(26)ҚТ-дан бастап Абай даңғылы, 50 бойынша жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	3 722	0	3 722	0	-3 722								
1.32	6(30)ҚТ-дан бастап Қабанбай батыр даңғылы, 7/2,7/3 бойынша "Ак-Орда" т.к. дейін Ду 80-200мм жылу трассасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	2 637	0	2 637	0	-2 637								
	<b>1-бөлім бойынша жиыны:</b>				<b>1 582 319</b>	<b>35 861</b>	<b>1 582 319</b>	<b>35 861</b>	<b>-1 546 458</b>								
	<b>2-бөлім.Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықтарды сатып алу</b>																
2.1	Ағынды суларға арналған батырылатын сорғы (берілісі 51 м3/сағ, арыны 16 м, қуаты – 2,2 кВт, жұмыс ортасының температурасы – 0-ден +40 °С дейін, шығу санылауының диаметрі, 2½ дюйм, батыру тереңдігі 10 м. дейін)	бірлік	1	0	334	0	334	0	-334	Жоспарлы көрсеткіштерге ағымдағы жылдың соңына дейін қол жеткізіледі							
2.2	Ластанған суларға арналған Гном 25-20 сорғысы (берілісі 25 м3/сағ, арыны 20 м, жұмыс ортасының температурасы – +35°С дейін, электр қозғалтқышының қуаты 3,0 кВт, батыру тереңдігі 7 м.)	бірлік	1	0	122	0	122	0	-122								
2.3	Қалыпты бұйымдарды дайындауға арналған қол экструдер (шикізатпен жұмыс істеу - полиэтиленді дәнеке шыбығы Ø3-4мм, шыбықты берудің шнекті механизмі)	бірлік	2	2	4 620	4 620	4 620	4 620	0	Орындалды							
2.4	КҚҚ-мен жиынтықтағы бетон қабырғаларын алмаз бұрғылау қондырғысы (диаметрлер диапазоны - 35-500 мм, тұтынатын қуаты - 3200 Вт, жылдамдық саны - 3)	бірлік	1	1	2 507	2 275	2 507	2 275	-232	Орындалды. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу.							
2.5	Жол блокираторы (оське жүктеме 30т, бұғаттаушы элементін көтеру биіктігі 400-500 мм, жұмыс ортасының температурасы - -30 бастап +40 °С дейін, ұзындығы - 4 м, жетек түрі - гидравликалық, басқару - батырмалы, өткізімді)	бірлік	1	0	4 969	2 485	4 969	2 485	-2 484	Орындалды. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу.							
	<b>2-бөлім бойынша жиыны:</b>	бірлік	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>12 552</b>	<b>9 380</b>	<b>12 552</b>	<b>9 380</b>	<b>-3 172</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>3-бөлім. Лицензиялық бағдарламалар мен атқару техникасын сатып алу</b>															
3.1	Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі ("ТГИД-07sq1 негізінде «Астана-Теплотранзит» АҚ өндірісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін бағдарламалық қамтамасыз етудегі "Өндірістік активтерді басқару" және "Жылу көзі режимі" кіші жүйесін әзірлеу, іске асыру және енгізу)	қызмет	1	0	11 000	0	11 000	0	-11 000	Жоспарлы көрсеткіштерге ағымдағы жылдың соңына дейін қол жеткізіледі						
	<b>3-бөлім бойынша жиыны:</b>	<b>қызмет</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>							
	<b>4-бөлім. Құралдар мен жүйелерді сатып алу</b>															
4.1	Бейне қабырға 3x3, экран өлшемі 46 дюйм (панель түрі: S-PVA тікелей жарықдиодты жарықтандыру. Экранның жұмыс алаңы (е x б) [мм]: 1 018,1 x 572,7. Экран өлшемі [дюйм/см]: 46 дюйм/116,8 см; Арақатынасы: 16:9.; Жарықтығы [кд/м2] кемінде: 700, 420 Эко (тасымалдау үшін параметрлер); Кереғарлығы (типтік мәні): 3500: 1.; Көру бұрышы [°]: көлденеңінен 178/ тігінен 178)	бірлік	1	0	10 136	8 421	10 136	8 421	-1 715	Орындалды. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу.						
	<b>4-бөлім бойынша жиыны:</b>	<b>бірлік</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10 136</b>	<b>8 421</b>	<b>10 136</b>	<b>8 421</b>	<b>-1 715</b>							
	<b>5-бөлім. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу</b>															
5.1	Автомобиль-манипулятор ж/к 10 тонна, ж/к орнату 6 тонна (Жүк автомобилі металл шанағы бар манипулятор. Кранның жүк көтергіштігі 6 000 кг кем емес, жебенің ұшуы 9 м кем емес.)	бірлік	2	0	64 693	0	64 693	0	-64 693	Жоспарлы көрсеткіштерге ағымдағы жылдың соңына дейін қол жеткізіледі						
5.2	Фронтальды жүк тиегіш (Шөміш көлемі 1,8 текше метр. Шөмішті басқару- тұтқалы. Шөміштің ені – 2 470 мм. Жүк көтергіштігі – 3 000 кг. Түсіру биіктігі-2 892 мм.)	бірлік	1	1	23 651	13 200	23 651	13 200	-10 451	Орындалды. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу.						
	<b>5-бөлім бойынша жиыны:</b>	<b>бірлік</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>88 344</b>	<b>13 200</b>	<b>88 344</b>	<b>13 200</b>	<b>-75 144</b>							
	<b>2022 жылға БАРЛЫҒЫ</b>				<b>1 704 351</b>	<b>66 862</b>	<b>1 704 351</b>	<b>66 862</b>	<b>-1 637 489</b>							

Басқарма төрағасы



Б. Азбаев

Орын. А. Бакашева





2022 жылдың бекітілген  
инвестициялық  
бағдарламаның орындалуына  
фотоматериалдар



## 1 Бөлім. Объектілерді қайта жаңарту, жобалау

---

п. 1.9. Құдайбердіұлы көшесі, 4 бастап Абылай хан даңғылы, 3 дейін жылу трассасын қайта жаңарту





## 2 Бөлім. Жабдықтың ескіргенін ауыстыру және жаңасын сатып алу

---



2.3 Қалыпты бұйымдарды дайындауға арналған қол экструдер (шикізатпен жұмыс істеу - полиэтиленді дәнеке шыбығы Ø3-4мм, шыбықты берудің шнекті механизмі)




2.4 КҚҚ-мен жиынтықтағы бетон қабырғаларын алмаз бұрғылау қондырғысы (диаметрлер диапазоны - 35-500 мм, тұтынатын қуаты - 3200 Вт, жылдамдық саны - 3)







## 2.5 Жол блоkirаторы

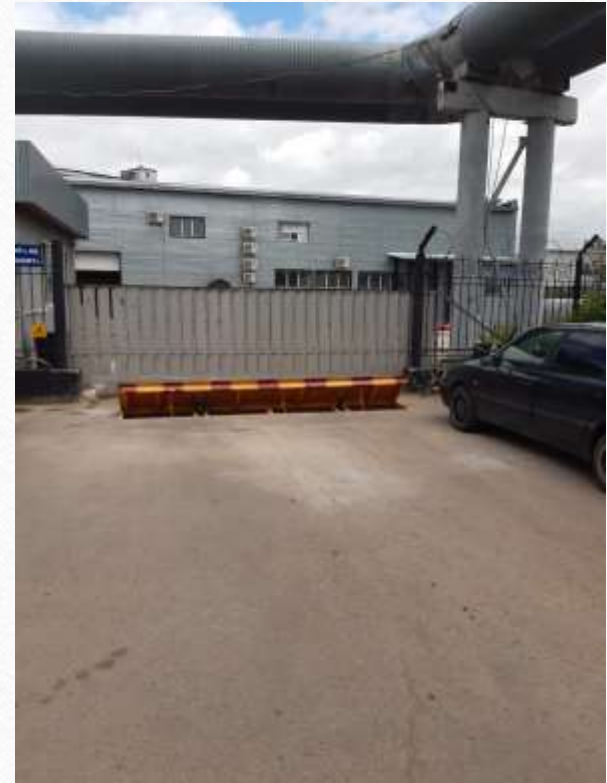




## 4 Бөлім. Құралдар мен жүйелерді сатып алу

---



#### 4.1. Бейне кабырға 3x3, экран өлшемі 46 дюйм

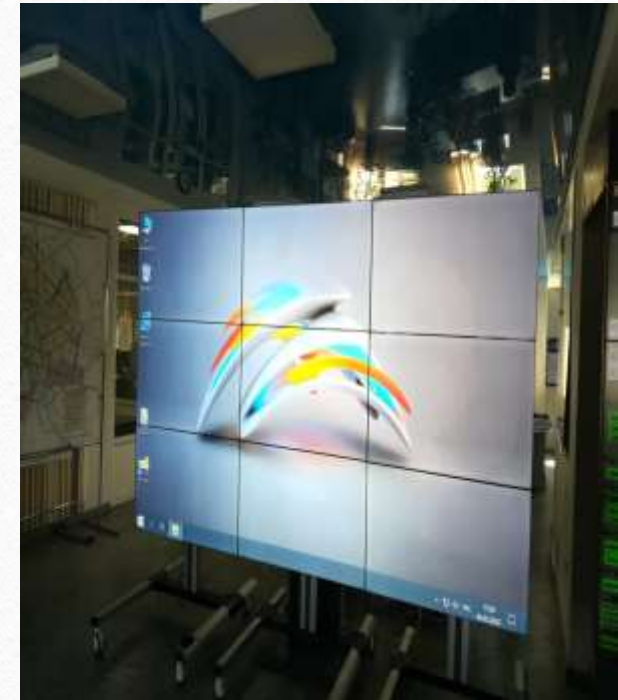



## 5 Бөлім. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу

---



5.2. Фронтальды жүк тиегіш (Шөміш көлемі 1,8 текше метр. Шөмішті басқару- тұтқалы. Шөмішті ені – 2 470 мм. Жүк көтергіштігі – 3 000 кг. Түсіру биіктігі-2 892 мм.)

