

Табиғи монополия субъектісінің 2025 жылдың 2-тоқсандағы бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат

Табиғи монополиялар субъектісінің атауы: "Астана - Теплотранзит" АҚ
Қызмет түрі: жылу энергиясын беру және тарату

Р/с №	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Олшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның сомасы),			Ауытқудың себептері	мың теңге КҚС-сыз			
			жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу		Меншікті қаражат (амортизация)	Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Реттелмеген (өзге) қызмет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Бөлім 1. Объектілерді қайта жаңарту, жобалау											
	Орамшілік желілер:											
1.1	Т.Шонаұлы көшесі, 41/1 бастап Т. Шонаұлы көшесі, 28 ауданындағы жылу торабына дейін 4(1)-КТ жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның қ.м.	466	0	74 412	0	-74 412	Жобаларға сараптамалар жүргізілді. Құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.	0	0	0	0
1.2	16(2)-КТ-дан бастап Есенберлин көшесі,11-13, Біржан сал көшесі,2 дейінгі 107-орамның жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	678	0	165 958	0	-165 958		0	0	0	0
1.3	Молдағұлова көшесі, 14 (3)-КТ ауданындағы 2Ду300мм (ППУ-ПЭ) жылу трассасына ойып орнатудан бастап Потанин көшесі, 14 ауданындағы ППУ-ПЭ-оқшаулаудағы 2Ду300мм жылу трассасына дейін жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның қ.м.	467	0	169 897	0	-169 897		0	0	0	0
1.4	16-аудан Республика даңғылы, 52/1 ("Сулпак" СУ) жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның қ.м.	268	0	83 991	0	-83 991		0	0	0	0
1.5	5(30)-КТ-дан бастап Корғалжын тас жолы, 2/1 (Астаналық цирк), Қабанбай батыр даңғылы, 5 ("Радуга" ТК) дейін жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның қ.м.	555	0	84 773	0	-84 773		0	0	0	0
1.6	Тәшенов көшесі, 9,15 бойынша 29 (23)-КТ жылу трассасын қайта жаңарту (Жастар шағын ауданы, 1-учаске, Тәшенов көшесі, 13 жертелесінен транзиттік трассаны шығару;	трассаның қ.м.	565	0	111 416	0	-111 416		0	0	0	0
1.7	Дүкенұлы көшесі, 22 бастап 10(6)-КТ-ға дейін жылу трассасын қайта жаңарту	трассаның қ.м.	587	0	94 713	0	-94 713		0	0	0	0
1.8	10(20)-КТ-дан бастап Сембинов көшесі, 28/3 дейін жылу желілерін қайта жаңарту	трассаның қ.м.	862	0	176 716	0	-176 716		0	0	0	0
1.9	Луи Пастер көшесінің бойымен "Хан Тәңірі" ТК-ге дейін 2Ду200/150/133/100мм ППУ-ға Энергетиктер кентінің Саргүл - Әлиев көшелері шекарасындағы 4-(24) -КТ жылу трассасын қайта жаңарту (1-учаске: 4-СС-дан бастап Высоцкий көшесінің алдындағы секцияға дейін)	трассаның қ.м.	793	0	177 967	0	-177 967		0	0	0	0
1.10	Ду 1000 51-ЖМ қайта жаңарту	трассаның қ.м.	740	0	137 683	0	-137 683		0	0	0	0
1.11	Күмісбеков көшесінен бастап Бейсекова көшесіне дейін Сейфуллин көшесі бойынша	трассаның қ.м.	185	0	232 615	0	-232 615		0	0	0	0
1.12	Күмісбеков көшесінен бастап Бейсекова көшесіне дейін Сейфуллин көшесі бойынша	трассаның қ.м.	136	0	163 837	0	-163 837		0	0	0	0
1.13	Күмісбеков көшесінен бастап Бейсекова көшесіне дейін Сейфуллин көшесі бойынша 2Ду500мм 43-ЖМ жылу магистралін күрделі жөндеу (ауыстыру). 2-кезек»	трассаның қ.м.	164	0	158 345	0	-158 345		0	0	0	0
1.14	Күмісбеков көшесінен бастап Бейсекова көшесіне дейін Сейфуллин көшесі бойынша 2Ду500мм 43-ЖМ жылу магистралін күрделі жөндеу (ауыстыру). 3-кезек»	трассаның қ.м.	438	0	588 716	0	-588 716		0	0	0	0
1.15	2-ӨТК-дегі трансформатор бөлмесін қайта жаңарту	қызмет	229	0	162 371	0	-162 371	Жылу желілеріне техникалық тексеру жүргізілді. Ағымдағы	3 573	0	0	0
1.16	75-ТП-дан 1670-КТ-ға дейін (L=1950к.) дейін 10 кВ КЖ-ны қайта жаңарту	қызмет	266	0	87 726	0	-87 726		188	0	0	0
1.17	Тұран даңғылы, 12 бойынша ӨТК ғимаратының төбе жабынын қайта жаңарту	қызмет	2 724	0	96 441	0	-96 441		157	0	0	0
1.18	Алдағы кезеңдерге қайта жаңарту нысандарын жобалау және сараптау	жұмыс	15	0	132 036	3 573	-128 463		71	0	0	0
1.19	"М.Өуезов көшесінен бастап Ә.Мәмбетов көшесіне дейін (11-КТ/13-КТ учаскесі), "Абылай хан даңғылы өтпесі 2Ду800мм ППУ-ПЭ 33-ЖМ учаскесін күрделі жөндеу" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	3 558	188	-3 370		389	0	0	0
1.20	"Мұстафин көшесінің қиылысы автомобиль жолына түсетін 2Ду800 ППУ-ПЭ (33-ЖМ) жылу трассасын күрделі жөндеу" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	5 008	71	-4 937		200	0	0	0
1.21	"33-ЖМ (Ду800мм), 18-ЖМ (Ду1000мм), «Астана-Теплотранзит» АҚ-қа Ду150мм желісі учаскелерін қайта жаңарту (23-ЖМ көпір өтпесіне қайта салу)" жобасын жобалау және	жұмыс	1	0	14 753	389	-14 364		68	0	0	0
1.22	"Әл-Фараби даңғылының өткелі (1(18)П ауданында) 33ЖМ (Ду800мм), 18-ЖМ (Ду1000мм) жылу трассасын қайта жаңарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	5 244	200	-5 044		162	0	0	0
1.23	"ППУ-ПЭ-дегі 2Ду219 мм ойым нүктесінен бастап Сейфуллин көшесі, 34 үйге 2Ду 159 мм ойым нүктесіне дейін жылу трассасын қайта жаңарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	4 046	68	-3 978					
1.24	"Өуезов көшесі 16 (10 (9)КТ) жертелесі арқылы ПЭ ППУ-дағы (компенсатор ауданы) 2Ду 325мм жылу трассасына ойым нүктесінен бастап ППУ ПЭ-дегі (11(9)КТ ауданы) 2Ду325мм жылу трассасына ойым нүктесіне дейін жылу трассасын қайта жаңарту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	5 626	162	-5 464					

Р/с №	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның сомасы),			Ауытқудың себептері	Меншікті қаражат (амортизация)	Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Реттелмеген (өзге) қызмет
			жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.25	"Б.Момышұлы даңғылы, 13/1, 13/2, 13/3, 13а, 13а-15а бойынша жылу желілерін қайта жанаңрту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	9 003	251	-8 752	жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.	251	0	0	0
1.26	"Темір жолдан Мұстафин көшесін түсіруге дейін 51-ЖМ учаскесін қайта жанаңрту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	5 454	182	-5 272		182	0	0	0
1.27	"Қажымұқан көшесі, 1 ауданында 2Ду300мм жылу желісін қайта жанаңрту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	6 171	90	-6 081		90	0	0	0
1.28	"Күйші Дина көшесі, 2/1, Тәуелсіздік даңғылы, 24,24а, 24б Ду150/100/80/50мм жылу трассасын қайта жанаңрту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	6 500	205	-6 295		205	0	0	0
1.29	"Абылай хан даңғылы, 42 жылу трассасын қайта жанаңрту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	15 705	374	-15 331		374	0	0	0
1.30	"2(27)КТ-дан бастап «Гарант» КТК-ге тармақталуға дейін 2Ду80-300 мм жылу трассасын қайта жанаңрту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	8 983	215	-8 767		215	0	0	0
1.31	"Байсейітова көшесі, 4 ауданындағы ППУ-ПЭ-мен түйісуден Құрақты қысқа көшесі, 16 (Суворов көшесі), Барқытбел қысқа көшесі, 28 дейінгі 2Ду70-250м 44(2) КТ жылу трассасын қайта жанаңрту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	28 598	807	-27 791		807	0	0	0
1.32	"14(7)КТ-дан бастап Жеңіс даңғылы, 36/1 дейін 2 Ду 100-200 мм жылу трассасын қайта жанаңрту" жобасын жобалау және сараптау	жұмыс	1	0	8 584	214	-8 370		214	0	0	0
1-бөлім бойынша жиынты:					2 899 614	3 573	-2 896 041		3 573	0	0	0
2-бөлім. Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықтарды сатып алу												
2.1	Ағынды суларға арналған батырылатын 30/50 сорғы (берілісі 51 м3/сағ, арыны 16 м, қуаты – 2,2 кВт, жұмыс ортасының температурасы – 0-ден +40 °С дейін, шығу санылауының диаметрі, 2½ дюйм, батыру тереңдігі 10 м. дейін)	бірлік	1	1	387	161	-226	Орындалды. Мемлекеттік сатып алудан үнемдеу	161	0	0	0
2.2	Ластанған суларға арналған Гном сорғысы (берілісі 25 м3/сағ, арыны 20 м, жұмыс ортасының температурасы – +35°С дейін, электр қозғалтқышының қуаты 3,0 кВт, батыру тереңдігі 7 м.)	бірлік	1	1	141	81	-60		81	0	0	0
2.3	Қалыпты бұйымдарды дайындауға арналған қол экструдер (Шикізатпен жұмыс істеу - полиэтиленді дәнеке шыбығы Ø3-4мм, шыбықты берудің шнекті механизмі)	бірлік	2	2	5 348	6 578	1 230		6 578	0	0	0
2.4	Дәнекерлеу жартылай автоматы (Жиынтық құрамы - инверторлы қуат алу көзі, сым беру механизмі, салқындату блогы, 380В желіден қуат алу, сым берудің 4-аунақшалы механизмі, номиналды қуаты 18 кВА-20 кВА, сым беру жылдамдығы 0-25 м/мин бастап)	бірлік	2	2	11 994	11 994	0		11 994	0	0	0
2.5	Электр қозғалтқыш (номиналды қуаты, 580 кВт; Қуат алу желісінің номиналды кернеуі, 6000 В; Қуат алу желісінің номиналды жиілігі, Гц 50; Номиналды айналу жылдамдығы, 1490 айн/мин; қуат коэффициенті 0.88; Номиналды ток, 67.3 А; ПӘК: 95,4% , Оқшаулаудың қызғуға төзімділігінің класы F; Қорғау дәрежесі IP54)	бірлік	1	0	77 306	0	-77 306	Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.	0	0	0	0
2.6	Электр қозғалтқыш (Қуаты 315 kW; желі жиілігі: 50 Hz; Полиэстер саны: 4; Айналу жиілігі: 1490 rpm; Сырғу: 0,67 %; Номиналды кернеуі: 380/660 V; Номиналды ток: 600/345 А артық емес; Іске жіберу тоғы: 4740/2730 А кем емес)	бірлік	1	0	12 252	0	-12 252		0	0	0	0
2-бөлім бойынша жиынты:		бірлік	8	6	107 428	18 814	-88 614		18 814	0	0	0

Р/с №	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның сомасы),			Ауытқудың себептері	Меншікті қаражат (амортизация)	Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Реттелмеген (өзге) қызмет
			жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3-бөлім. Инвестициялық бағдарламалар мен әртүрлі техникасын сатып алу											
3.1	Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі ("ТГИД-07sqi негізінде «Астана-Теплотранзит» АҚ өндірісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін бағдарламалық қамтамасыз етудегі "жылу ысыраптары" және "желілік судың ысыраптары" көрсеткіштері бойынша жылу желілерінің техникалық жай-күйін және олардың пайдалану деңгейін есепке алу" кіші жүйесін әзірлеу, іске асыру және енгізу)	қызмет	1	0	14 000	0	-14 000	Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.	0	0	0	0
	4-бөлім. Құралдар мен жүйелерді сатып алу	қызмет	1	0	14 000	0	-14 000		0	0	0	0
4.1	Санылау тапқыш (түсті сенсорлық дисплей 5.7" VGA 640 - 480 пиксель. Іске қосылуы: сезгі құрылғысы, гидрофон, екі сыртқы антенна, құлаққап, GPS, жерүсті микрофон, белсенді күшейткіші бар пьезо-сезгіші)	бірлік	1	0	5 867	0	-5 867	Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.	0	0	0	0
4.2	Жылу сезгіш (жұмыс температурасының диапазоны -15 +50 °C дейін, өлшеу диапазоны -20 +250°C дейін, мин. фокустау қашықтығы 0,5 м, Экран рұқсаты 160 x 120 пиксель (ИК) кем емес, 320 x240 пиксель (MSX) кем емес)	бірлік	1	0	1 253	0	-1 253		0	0	0	0
4.3	Лазерлі ұзындық өлшеуіш (Өлшеу диапазоны 0,05 - 100 м, қателігі 10 мм, шаң, ылғалға төзімділігі)	бірлік	11	0	266	0	-266		0	0	0	0
	4-бөлім бойынша жиыны:	бірлік	13	0	7 386	0	-7 386		0	0	0	0
	5-бөлім. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу											
5.1	16 тонна ж/к автокраны (жүк көтергіштігі-16т кем емес, көтеру биіктігі, м - 8,7-18,4 кем емес, қондырғы тіректері – гидравликалық, топсалы-шығармалы. Кран механизмдерінің жетегі – шасси қозғалтқышымен іске қосылатын сорғыдан, гидравликалық.)	бірлік	2	0	98 244	0	-98 244	Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.	0	0	0	0
5.2	Автомұнара 18-м (қондырғының жүк көтергіштігі 300 кг кем емес, жебенің ұшуы 22 м кем емес.)	бірлік	1	0	21 777	0	-21 777		0	0	0	0
5.3	Бульдозер қайырмасы мен дәнекерлеу генераторымен донғалақты трактор (трактор түрі-донғалақты, әмбебап класты 1,4 тс, трактор алдында ОЖ-82 аспалы бульдозер қайырмасы, түрі бұрылмайтын сфералық алдыңғы күрек- бұрылмайтын, қатты, көтеру/түсіру бір гидроцилиндрмен, жартылай рамаға орнату, лонжеронға бекітілген, дәнекерлеу генераторы трактордың артында аспалы рамада, түрі ГД 2*2503, екі постылы дәнекерлеу генераторы)	бірлік	4	0	59 268	0	-59 268		0	0	0	0
5.4	Ершікті тартқыш (Жабдықталған салмағы - кемінде 7 200 кг. Алдыңғы оське жүктеме - кемінде 4 000 кг, артқы арбаға жүктеме – кемінде 3 200 кг., ершікті тіркеме құрылғыға жүктеме – кемінде 15 000 кг.)	бірлік	1	0	42 507	0	-42 507		0	0	0	0
5.5	Жартылай тіркеме Нефаз 20 тонна (Шанак түрі - металл, борттық, тік бұрышты пішінді қайырмалы бүйірлі, артқы ернеулері бар, арба-екі осьті, тірек құрылғысы, түрі - екі бұрандалы домкрат, тасымалданатын жүктің массасы кемінде 19 400 кг, шаңақтың көлемі кемінде 21,7 текше м. Жабдықталған массасы кемінде 6 400 кг, Толық массасы кемінде 25 800 кг)	бірлік	1	0	8 455	0	-8 455		0	0	0	0
5.6	Тез алынатын механизмді бар жиынтықтағы 0,85 м3 дөңгелекті экскаватор	бірлік	1	0	86 429	0	-86 429		0	0	0	0
5.7	400мм қосымша шаңағы бар, тез алынатын механизмді бар жиынтықтағы жүк тиегіш экскаватор	бірлік	1	1	53 802	53 800	-2	Орындалды. Мемлекеттік сатып алудан үнемдеу	53 800	0	0	0
5.8	КАМА3-65115 шассиіндегі лиссорғыш машина	бірлік	1	0	90 590	0	-90 590	Ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізіледі.	0	0	0	0
	5-бөлім бойынша жиыны:	бірлік	12	1	461 071	53 800	-407 271		53 800	0	0	0
	2024 жылға БАРЛЫҒЫ:				3 489 500	76 187	-3 413 312		76 187	0	0	0

Басқарма төрағасы

Қ.Бегімов







2025 жылдың 2 тоқсанына
бекітілген инвестициялық
бағдарламаның орындалуына
фотоматериалдар



1 Бөлім. Объектілерді қайта жаңарту


Жылумен жабдықтау объектілерін қайта құру жұмыстары




п.1. Т.Шонанұлы
көшесі, 41/1 бастап Т.
Шонанұлы көшесі, 28



п.2. 16(2)-ҚТ-дан бастап
Есенберлин көшесі, 11-13

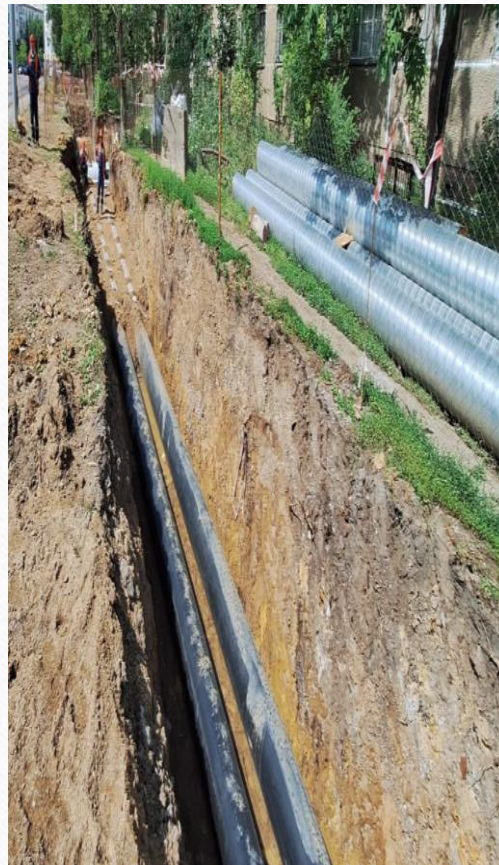

п.3. УТ-14(3)
Молдагуловой көшесі

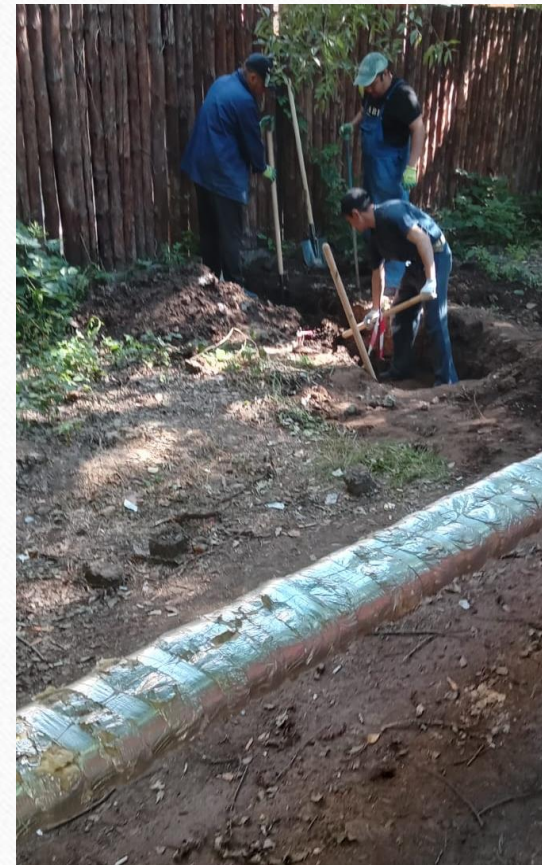


п.4. даңғылы Республики,
52/1 (ТД Сулпак)


Жылумен жабдықтау объектілерін қайта құру жұмыстары



п.6. Тәшенов көшесі, 9,15

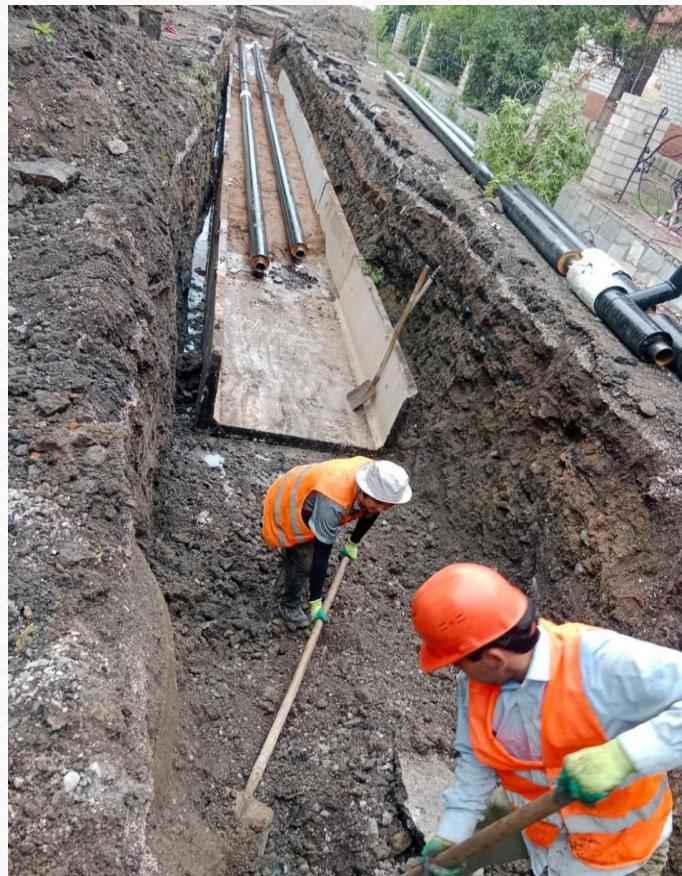

п.8. 10(20)-ҚТ-дан бастап
Сембинов көшесі, 28/3
дейін

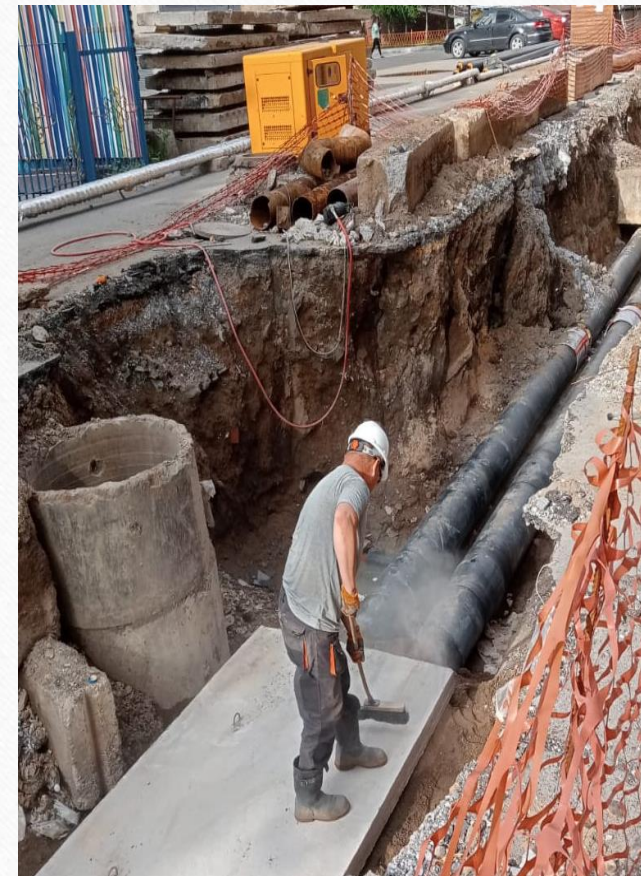

п.9. Луи Пастер көшесінің
бойымен "Хан Тәңірі" ТК-ге дейін



2 Бөлім. Жабдықтың ескіргенін ауыстыру және жаңасын сатып алу


2.1 Ағынды суларға
арналған батырылатын
сорғы



2.2 Ластанған суларға
арналған сорғысы



2.3 Қол экструдер

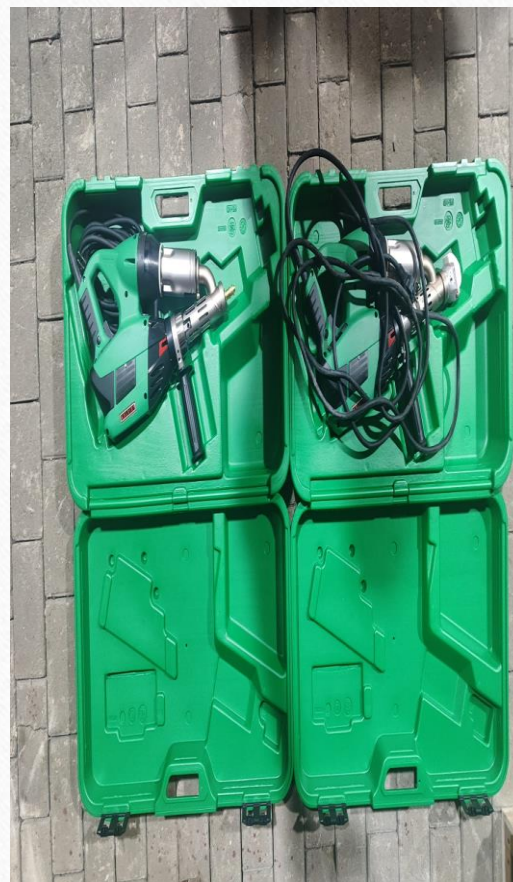

2.4 Дәнекерлеу
жартылай автоматы





5-бөлім. Көлік және арнайы механизмдерді сатып алу

5.7 Жүк тиегіш экскаватор

